Hassocks

Rev B

Hope & Clay (Construction) Ltd

ID	Name	Start	Finish	Duration
1	Crossroads			
2				
3	Close Road	24/07/19	02/09/19	29d
4	4 Way Temporary Traffic Lights	03/09/19	08/11/19	49d
5	TM to be removed for London to Brighton Car Ru	01/11/19	01/11/19	0d
6				
7	Construct Retaining Walls & Steps	24/07/19	13/08/19	15d
8	Remove Existing Signals	24/07/19	26/07/19	3d
9	Excavate Southern Widening	29/07/19	30/07/19	2d
10	Stone Up	31/07/19	01/08/19	2d
11	Gullies	02/08/19	02/08/19	1d
12	Kerbing	05/08/19	06/08/19	2d
13	Overrun Strip	07/08/19	12/08/19	4d
14	Breakup Existing Islands	13/08/19	15/08/19	3d
15	Signal Ducting	11/09/19	26/09/19	12d
16	Construct Islands	16/08/19	20/08/19	3d
17	Nal Sockets	21/08/19	23/08/19	3d
18	Tactiles	26/08/19	27/08/19	2d
19	Reconstruct London Road Island	28/08/19	30/08/19	3d
20	Signals Ducting Across London Road	28/08/19	30/08/19	3d
21	Signals Ducting Keymar Road	02/09/19	10/09/19	7d
22	Tactiles			
23	Signals Ducting London Road South Bound	11/09/19	27/09/19	13d
24	Signals Ducting London Road North Bound	30/09/19	16/10/19	13d
25	Street Lighting	17/10/19	23/10/19	5d
26				
27	Signals Installation	21/10/19	08/11/19	15d
28	Signage	22/10/19	23/10/19	2d
29	Surfacing	24/10/19	25/10/19	2d
30	Road Markings	08/11/19	08/11/19	1d

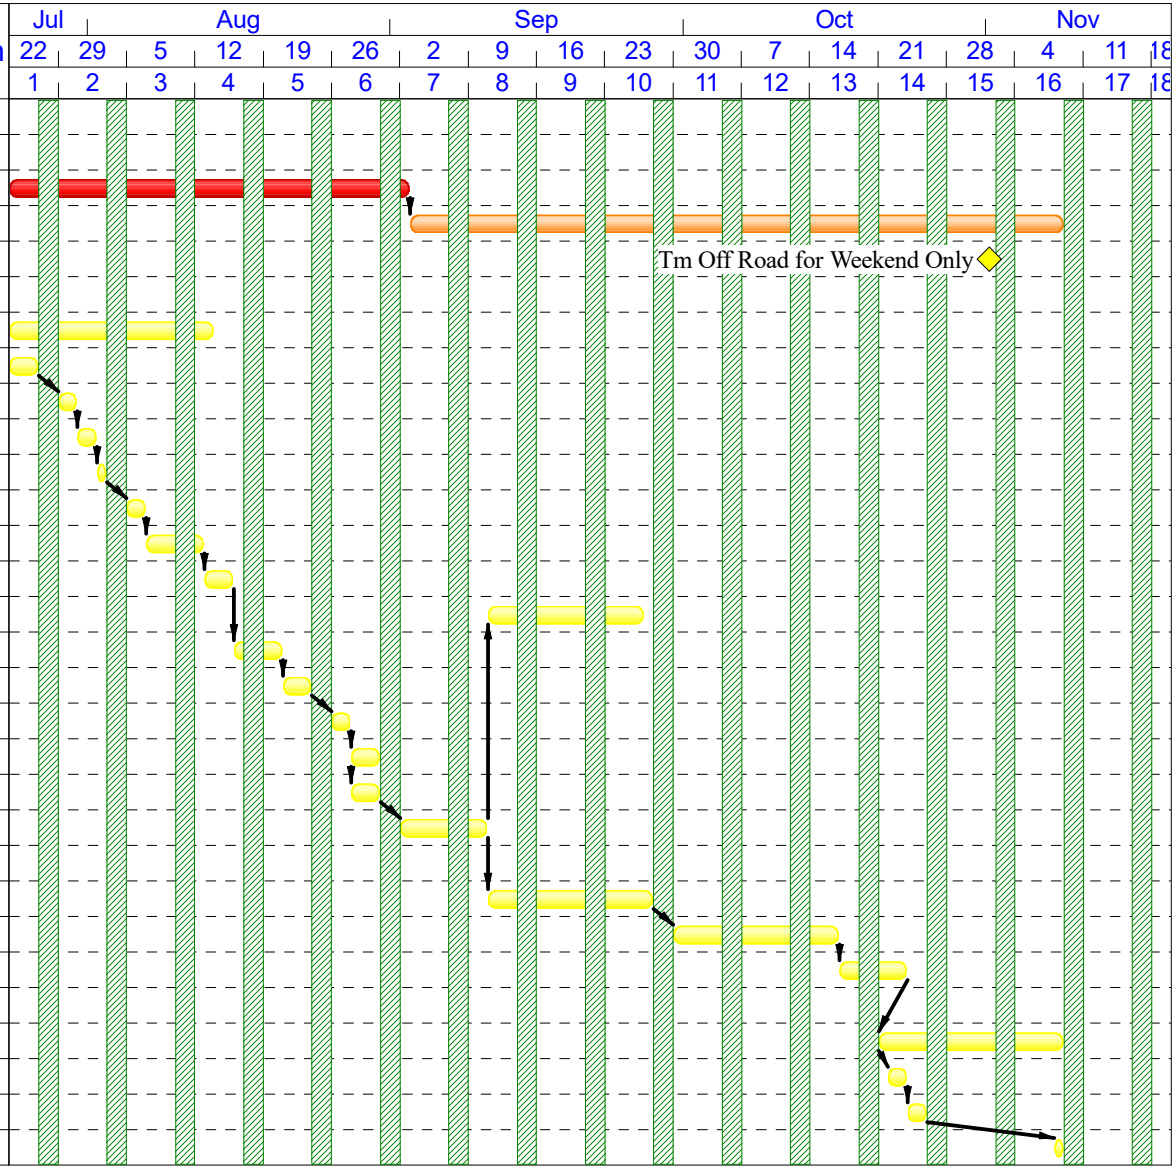

4 Way Temp Lights Veteran Car Run TM Road Closure
